



गोदावरी नगरपालिका आ.व २०७९।०८० प्रगती विवरण

नगरपालिकाको आधारभूत विवरण

पालिकाको नाम : गोदावरी नगरपालिका

नगर प्रमुखको नाम : विरेन्द्र भट्ट

९८५८४२७०१७

•नगर उप-प्रमुखको नाम :शारदा देवी रोकाया

९८५८४२७०१६

•प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाम : हरिदत्त भट्ट

९८५८४३५१११

•जम्मा वडा संख्या : १२

•पालिकाको कुल जनसंख्या : ९९९७३

४७८७३

•जम्मा परिवार संख्या : २१५०८

पालिकाको कुल क्षेत्रफल : ३०८.६३ वर्ग कि.मि.
कि.मि.

जिल्ला : कैलाली

मोवाइल नं :

मोवाइल नं :

मोवाइल नं :

महिला : ५२१००

पुरुष :

कृषि योग्य भूमिको क्षेत्रफल : १६९. ४५वर्ग

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम

रु. हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम			खर्च	वित्तिय प्रगति
	नाम	बजेट	लक्ष्य		
१	एभरेस्ट स्कुल देखि चैतन्यपुर जोड्ने सडक	८०,००	क्षेत्र	३६,९७	४६.२२
२	चैतन्यपुर (खैराना खोला) पुल निर्माण	६०,००	क्षेत्र	६०,००	१००.००

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान) स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम

रु. हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम			खर्च	वित्तिय प्रगति
	नाम	बजेट	लक्ष्य		
१	चौकि डाडा खानेपानी आयोजना-03,कैलाली	२,००,००	क्षेत्र	२,००,००	१००.००

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम			खर्च	वित्तिय प्रगति
	नाम	बजेट	लक्ष्य		
१	शान्तिटोल ढल निकास वडा नं. ४ बसन्तपुर	२५,००	मिटर	११,९४	४७.७६

गोदावरी नगरपालिकाको कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको विवरण			जम्मा
	स्थायी	करार	ज्यालादारी	
	७७	१४०		

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सशर्त अनुदान) स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम

रु. हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम			खर्च	वित्तिय प्रगति
	नाम	बजेट	लक्ष्य		
१	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :- सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला क्षेत्र नं. ४ अन्तर्गत गोदावरी न.पा.- ३३५ वटा (क्रमागत)	६२,००	संख्या	६२,००	१००.००
२	विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण अनुदान (२ कोठे तथा ४ कोठे भवन)	१,१२,५०	कोठा	१,१२,४३	९९.९४
३	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय,विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोनति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	१२,००	कोठा	१२,००	१००.००
४	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय,विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोनति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	३२,००	कोठा	३२,००	१००.००
५	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय,विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोनति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	६,००	कोठा	६,००	१००.००
६	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण (कम्प्यूटर, फर्निचर फिक्चर्स, क्यामरा, अन्य विद्युतीय उपकरण)	३,००	संख्या	२,४३	८१.३२
७	Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR Refrigerator खरीद	४,००	संख्या	३,९८	९९.५७

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम			खर्च	वित्तिय प्रगति
	नाम	बजेट	लक्ष्य		
८	गोदावरी नदी झो.पु., शिव भगवती मन्दिर जुना अखाडा	२०,००	संख्या	४,६०	२३.००
९	नवीकरणीय ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोग्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा)	१०,००	लाइन	५,२३	५२.३९
१०	कैलाली जिल्ला अन्तर्गतका गोदावरी ४, घोडाघोडी १०, बास्कोटा खापा लगायतका आयोजनाहरुको एकिन (Screening) तथा पहिचान गरी संघीय स्तरको आयोजनाको DPR बमोजिम निर्माण कार्य सुरु गर्ने	३,३३	N/A	०	०.००
११	गोदावरि कोल्मुडा खा पा आ सु वि गोदावरि ११	३,३३	परिवार	०	०.००
१२	शिव मन्दिर तथा विवाह मण्डल गौदावरी न पा १ मनोहरा कैलाली	७,५०	N/A	७,५०	१००.००
१३	नायल शहिद पार्क निर्माण गोदावरी न पा १२ कैलाली	१०,००	क्षेत्र	१०,००	१००.००
१४	विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढिकरण एवम् Digital library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	१३,००	कोठा	१३,००	१००.००
१५	नायल ताल व्यवस्थापन तथा सिद्ध भगवती मन्दिर गोदावरी १२, नायल कैलाली	१०,००	क्षेत्र	१०,००	१००.००
१६	हंश मन्दिर संरक्षण गोदावरी न.पा.१ अतरिया कैलाली	७,५०	N/A	७,५०	१००.००
१७	मनकामना भगवती मन्दिर गोदावरी न पा १२ चापागाउँ कैलाली	७,५०	N/A	७,५०	१००.००
१८	ग्वासि समैजी मन्दिर गोदावरी नपा १२ चाँप	७,५०	N/A	७,५०	१००.००
१९	नायलताल हुदै पश्चिम पट्टीको सिद्ध भगवति पदमार्ग गोदावरी न.पा १२ , कैलाली	३०,००	मिटर	३०,००	१००.००

शीर्षक	उपशीर्षक	आ.व. २०७७।०७८		आ.व. २०७८।०७९		आ.व. २०७९।०८०	
		विनियोजित बजेट	कार्यान्वयनको अवस्था	विनियोजित बजेट	कार्यान्वयनको अवस्था	विनियोजित बजेट	कार्यान्वयनको अवस्था
खर्च	चालु	६२८३३१	५४५४५७	७३६९६७	६५२०६६	८०२७४१	७१४०७१
	पुँजीगत	५८६२१५	२८६८४१	५५७२८३	३१४३६७	५४२०६२	३६४१२७
	वित्तीय व्यवस्था						
राजश्वका स्रोत	कर राजश्व	२१८६८	२८४०९	२१५२४८	२७२०४६	२६७०३८	२११२३८
	गैर कर राजश्व	८९७०८	५२२०५	९७२२४	८७२७३	८८७९६	७५३०१
	अन्य		१९८३३५			१६०१०	१६०१०
अनुदान (संघ र प्रदेश)	समानीकरण	१९९१८४	६२२६१	२१८६३५	२१८६३५	२१४४००	१९८३२०
	सशर्त	४४७६३५	३७९९७७	४७०४४९	४६९९०७	४६१९५३	४३५७२४
	विशेष			१५०००	१०१४१	२००००	२००००
	समपुरक	४१३०८	२६३००	१२१४४	४०००	१६५००	१०८९१
राजश्व बाँडफाँड	प्राप्ती	१७७७५८	२०९८९१	१४३३८१	१६४६९४	१७३६८९	१३५३११
	हस्तान्तरण						
बजेट विनियोजन प्राथमिकता	भौतिक पुर्वाधार	३३२३८७	१६३२०३	३५१२०९	१७५४०३	३२१११५	१९४१०९
	कृषी	१४७४८	८३१३	३१७९२	१५६६०	३२४२५	१६२४४
	उद्योग	६६४०	३१८७	५०८०	४६०१	५६७३	५६३८
	पर्यटन	२१५०		४२०२	३२२५	७१५०	७०९७

गोदावरी नगरपालिका योजना कार्यान्वयन

योजना कार्यान्वयनको अवस्था						
बिबरण	योजना संख्या ।आर्थिक वर्ष					
	०७४।०७५	०७५।७६	०७६।०७७	०७७।०७८	०७८।०७९	०७९।०८०
उपभोक्ता समिति मार्फत	३३२	३६०	४६०	३७१	५३२	४९२
निर्माण व्यवसायी मार्फत	१०	१३	१५	१६	२९	१७
गैरसरकारी संस्था मार्फत	०६	१५	२१	१७	१४	१०



गोदावरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कैलाली
कार्यालयको कोड : ८०७७७४०१३००

आ.व. : २०७९/८० प्रकार : आन्तरिक राजस्व				
SN	राजस्व संकेत	आम्दानी शीर्षक	अनुमान	यथार्थ आय
१	११३१३	एकीकृत सम्पत्ती कर	६०,००,०००.००	३०,६१,६३४.३५
२	११३१४	भुमिकर/मालपोत	१,००,००,०००.००	८७,७७,०१२.८७
३	११३२१	वहाल कर	४५,००,०००.००	९८,७१,६५५.००
४	११६९१	अन्य कर	५०,००,०००.००	४६,५५,०००.००
५	१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	५,००,०००.००	५,५७,२९८.००
६	१४२१२	सरकारी सम्पत्तीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	२०,०००.००	५४,०३०.००
७	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	६,५०,००,०००.००	३,८८,५७,३८०.००
८	१४२२४	परीक्षा शुल्क	२,००,०००.००	२३,७००.००
९	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२०,००,०००.००	५७,८३,३०५.००
१०	१४२४१	पार्किङ्ग शुल्क	५२,००,०००.००	८६,००,१०१.००
११	१४२४२	नक्सापास दस्तुर	२५,००,०००.००	४४,३५,३१३.३५
१२	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	४५,००,०००.००	४३,५५,१२३.००
१३	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	५,००,०००.००	८,५५,६६०.००
१४	१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	२,००,०००.००	२,३५,०८०.००
१५	१४२४९	अन्य दस्तुर	३३,००,०००.००	२३,४८,७३८.३३
१६	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	७,००,०००.००	८,४६,९६१.५०
१७	१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	५०,०००.००	२,४८,०००.००
१८	१४५२९	अन्य राजस्व	५,००,०००.००	४१,६१०.००
१९	१४६११	व्यवसाय कर	३६,००,०००.००	५४,६३,१४५.००
२०	१५१११	बेरूजू	१,००,०००.००	१,५१,०५४.००
जम्मा			१,०२,३८,०८,२५०.००	९,९२,२१,८०१.४०


स्थानीय तहबाट हालसम्म जारी भएका कानून
(ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड)

जम्मा ८५


- क. ऐनहरु:- २७ वटा
- ख. कार्यविधि – ४० वटा
- ग. निती: ९
- घ निर्देशिका: ८
- ङ मार्गदर्शन: १

वडा नं.	स्वीकृत योजना संख्या	भौतिक लक्ष्य	एकाई	स्वीकृत जम्मा रकम	खर्च रकम	प्रगति	
						भौतिक प्रतिशत	वित्तिय प्रतिशत
१	२१	२१	वटा	९३००	५५७६	१००	९३.४१
२	३१	३१	वटा	८७२०	३६२४	९९	८९.६२
३	५३	५३	वटा	७५६५	३५०८	९९	९५.४७
४	२४	२४	वटा	८२७३	६५०८	१००	९३.२१
५	१९	१९	वटा	६८०५	५४०८	१००	९५.६५
६	४९	४९	वटा	७३१०	५०६८	९४	७६.८८
७	२७	२७	वटा	६७७५	४७७८	१००	९३.५८
८	४७	४७	वटा	७६५०	५३०३	९९	९१.१८
९	८४	८४	वटा	७४६३	६८०९	९७	९१.९
१०	८	८	वटा	६६७५	५७५६	९९	७९
११	१६	१६	वटा	६३३३	२८१०	९९	८५.३९
१२	२७	२७	वटा	८१५०	७९१४	९९	९०.४२
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत	९६	९६	वटा	४७४०२.५ ८		९२	८७.०४
क्रमागत योजनाहरु	१३२	१३२	वटा	१५९९८५		७५	६५.६३

वडा अनुसार विनियोजित र खर्च रकम

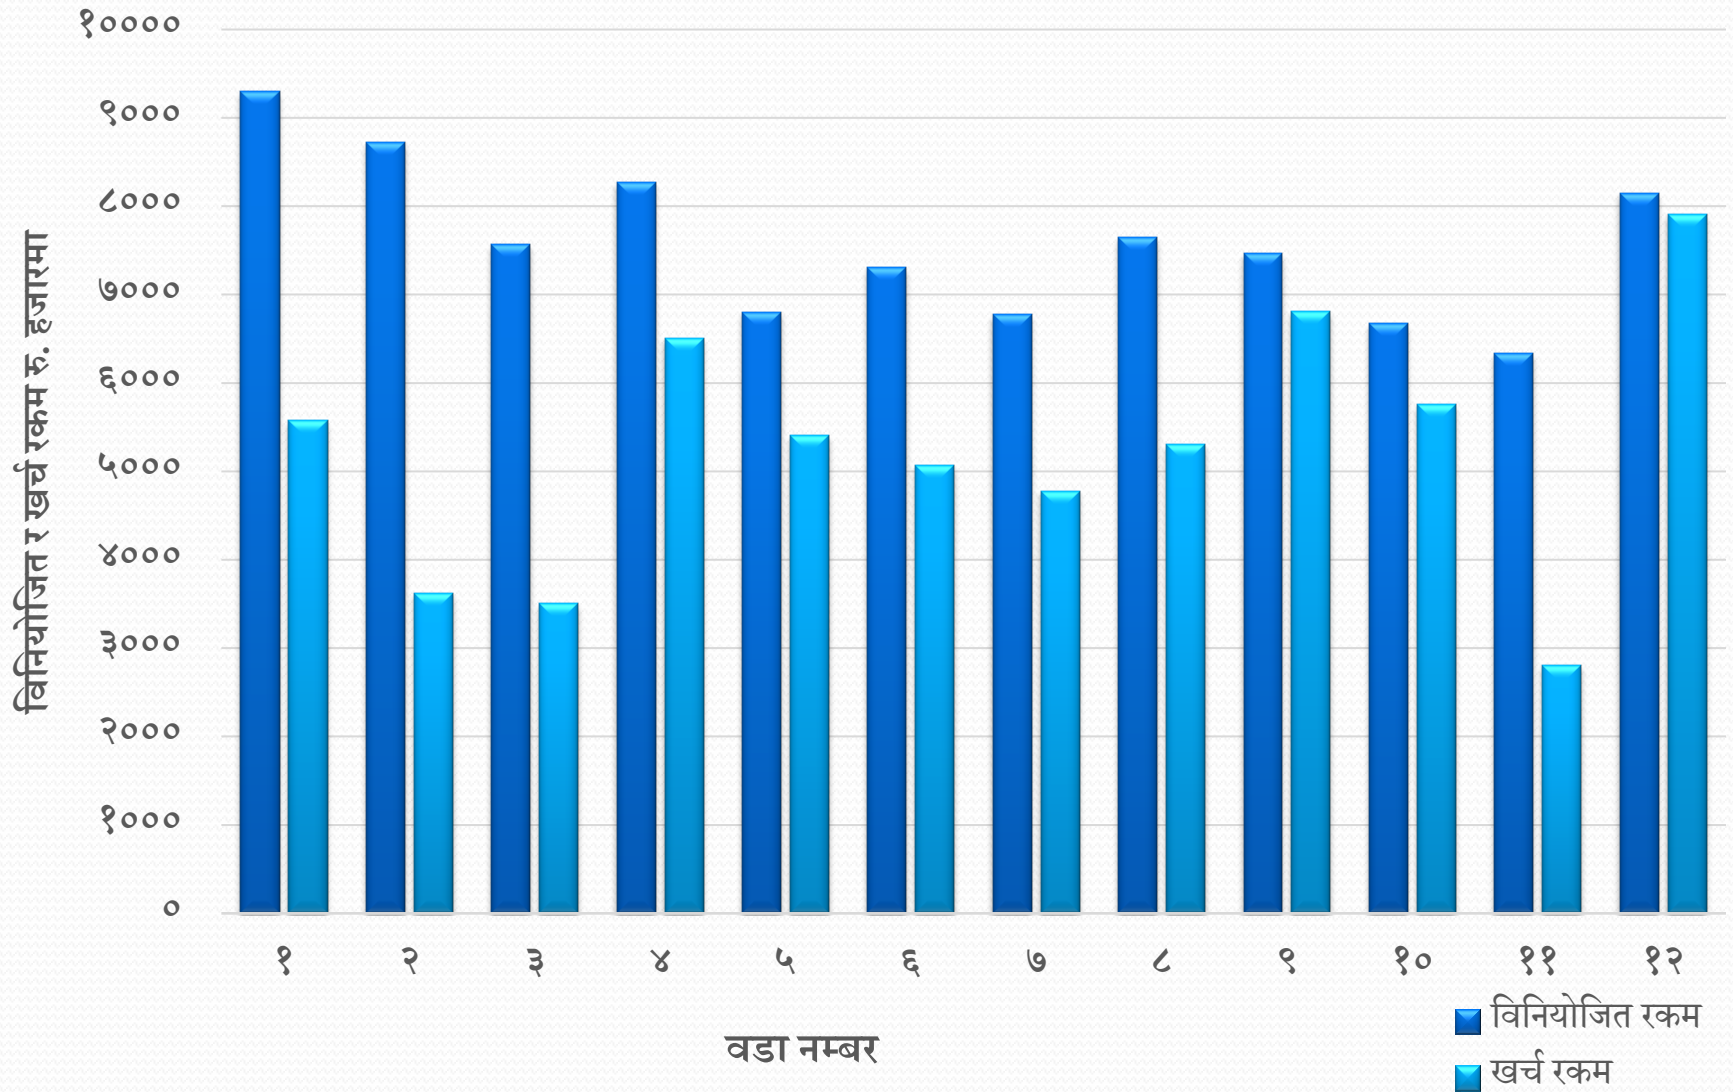

वडा अनुसार भौतिक र वित्तीय प्रगति

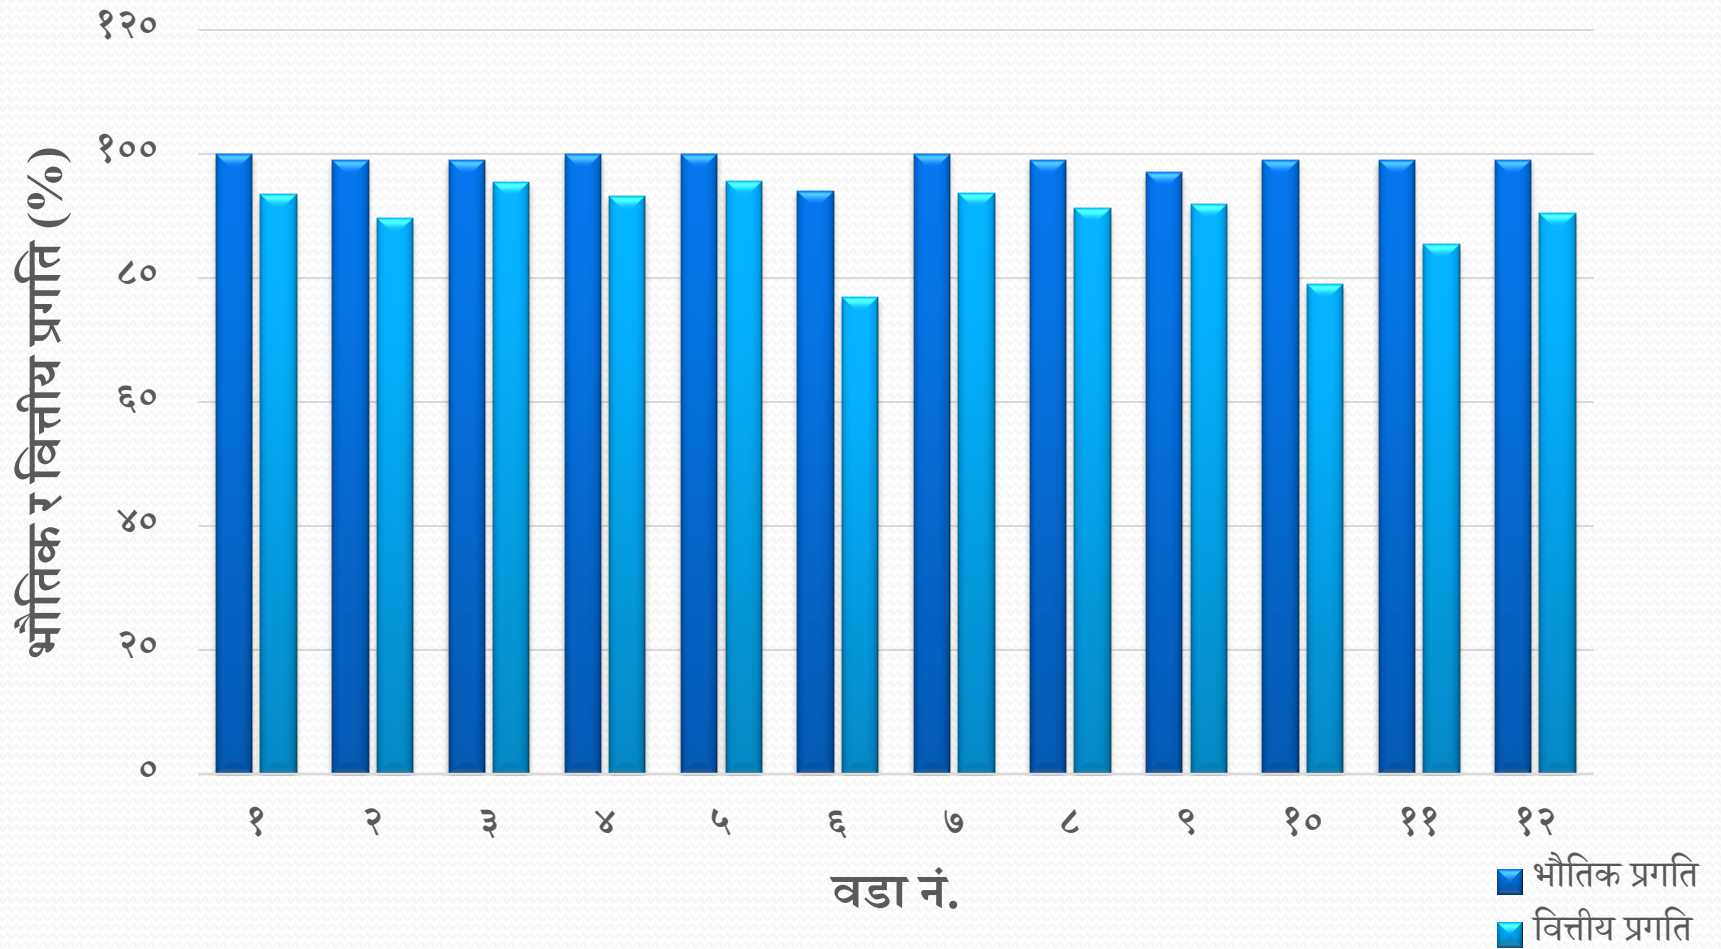

आ. व. २०७९/०८० मा सञ्चालित योजना सम्बन्धी विवरण

Ø बजेटको आधारमा: वडा स्तरिय विनियोजित

क्र.सं.	विवरण	योजना संख्या
१	५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना	२
२	५ लाख देखि ५० लाख सम्मको आयोजना	२६
३	५ लाख भन्दा कम बजेटको आयोजना	३७८

Ø योजनाहरुको कार्यान्वयन तह/क्षेत्र

क्र.सं.	विवरण	योजना संख्या
१	न.पा. स्तरीय	९३
२	वडास्तरीय	३९९
	जम्मा	४९२

Ø योजना कार्यान्वयन:

क्र.सं.	विवरण	योजना संख्या
१	उपभोक्ता समिति मार्फत	४९२
२	निर्माण व्यवसायी मार्फत	१७
३	गैरसरकारी संस्था मार्फत	
४	अन्य केही भए खुलाउने.....	
	जम्मा	५०९

क्षेत्रगत भौतिक प्रगतिको अबस्था(आ.ब.२०७९/०८०)

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	लम्बाई/ईकाइ	भौतिक प्रगति(%)	प्रमुख उपलब्धी
१	सडक	कालोपत्रे/ढलान	(कि.मी.) ३१	१००	यातायातको सुविधा उपलब्ध भएको
		ग्रावेल	(कि.मी.) २३०	१००	सडक स्तरोन्नती भएको
		ट्रयाक खोल्ने	(कि.मी.) ८०	१००	यातायातको पहुँच बढेको
२	पुल निर्माण	पक्की पुल	१ वटा (गेडेपानी)	१००	आवतजावतमा सहजता भएको
		झोलुङ्गे पुल	५ वटा		
		स्टिल पुल	२ वटा		
३	खानेपानी तथा ढल निर्माण	खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराएका परिवार	संख्या ७०००	६०	खानेपानीको सुविधा भएको
		खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित घरपरिवार	संख्या २०००० घरधुरी	५०	खानेपानीको पहुँच पुगेको
		ढल निर्माण	(कि.मी.) १५	३०	ढलबाट शहरी सरसफाइ भएको
४	वृक्षरोपण		संख्या ५०० प्रति वर्ष		
५	नदी नियन्त्रण		(कि.मी.) ५	५०	बस्ती सुरक्षित भएको

क्षेत्रगत भौतिक प्रगतिको अवस्था(आ.ब.२०७९/०८०)

६	सामाजिक सिँचाई		हेक्टर		
७	जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा	उत्पादन	(कि.वा.) ०		
		प्रशासन लाइन विस्तार	(कि.मी.) ०		
८	पोखरी ताल तलैया		संख्या ०		
९	फोहोरमैला व्यवस्थापन	डम्पिङ्ग साइट	संख्या.....		
		स्यानीटरी	संख्या ०१		
		ल्याण्डफिल्ड साइट			
		नयाँ मेशिन उपकरण जडान	संख्या.....		
१०	नयाँ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न		संख्या ३५		
११	स्वास्थ्य चौकी निर्माण		संख्या १५		
१२	यात्रु प्रतिकालय		संख्या ७		
१३	सामुदायिक भवन निर्माण		संख्या ५		


--आ व २०७९।८० को नक्सापासको विवरण

मिति	प्लिन्थ लेबल ईजाजत पत्र	सुपर स्टक्चर स्थायी ईजाजत पत्र	आंशिक निर्माण सम्पन्न	निर्माण सम्पन्न	अभिलेखिकरण
२०७९।०४।०१ देखि २०८०।०३।३०	१९१	९०	२३	८१	६३

घर नक्सा पास संख्या

२०७६।०७७	२०७७।०७८	२०७८।०७९	२०७९।०८०	जम्मा
८०	१९३	२३१	३८५	८८९

कृषी शाखा अन्तर्गत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था



■ सम्पन्न हुन नसकेको

■ सम्पन्न भएको

गोदावरी नगरपालिकामा विवाद फछ्यौटको स्थिति

क्र.सं.	फछ्यौट विवाद संख्या	प्रकृत्यामा रहेका विवाद संख्या	जम्मा विवाद संख्या
१	१२४	१८	१४२

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वार्षिक विनियोजन बजेट	खर्चको अवस्था	कारण/कैफियत
१	टोल सुधार समितिका पदाधिकारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम	3,00,000	0	बजेट अभाव
२	आमा समूहका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास तालिम	3,00,000	0	बजेट अभाव
३	MIS Online पुनर्ताजगी तालिम	1,50,000	0	बजेट अभाव
४	आमा समूह संख्या			हालसम्म दर्ता भएका 98 वटा
५	टोल सुधार समिति संख्या			हालसम्म दर्ता भएका 87 वटा
६	संस्था दर्ता, संस्था अनुमती, बालक्लव दर्ता तथा नविकरण सिफारिस			३० वटा
7	जे.ना. ७० वर्ष माथि			4576 जना
8	जे.ना. दलित			899 जना
9	जे.ना. एकल महिला			749 जना
10	विधवा			1794 जना
१1	अपांग "क" वर्ग			10२ जना
१2	अपांग "ख" वर्ग			445 जना
१3	दलित बालबालिका (बालपोषण भत्ता)			2013 जना
१4	जम्मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही संख्या			१०५७८ जना
१5	सामाजिक सुरक्षा भत्ता	3३,11,47,000	३३,११,47,000	चौथो किस्ता फर्छयौट हुन बाँकी

सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने बैंकहरु

आव २०७९/८० मा

आ.व. २०८०/८१ का लागि सम्झौता भएका बैंकहरु

वडा नं.	सासु वितरण गर्ने बैंकको नाम	वडा नं.	बैंकको नाम
१ र २	कुमारी बैंक	१	हिमालयन बैंक लि. अत्तरिया
३ र ५	प्रभु बैंक	२	सानिमा बैंक लि. अत्तरिया
४	मेगा बैंक	३ र १२	एन.आइ.सि. एसिया बैंक अत्तरिया
६	माछापुच्छ्रे बैंक	४	नेपाल ईन्भेस्टिमेन्ट मेगा बैंक लि.
७	सिद्धार्थ बैंक	५	प्रभु बैंक लि. अत्तरिया
८	सनराइज बैंक	६	माछापुच्छ्रे बैंक लि.
९	महालक्ष्मी विकास बैंक	७	सिद्धार्थ बैंक लि.
१०	गरिमा विकास बैंक	८	लक्ष्मी सनराइज बैंक लि.
११	प्राइम बैंक	९	महालक्ष्मी विकास बैंक लि.
१२	संग्रिला डेभ्लोपमेन्ट बैंक	१०	गरिमा विकास बैंक लि.
		११	प्राइम कमर्सियल बैंक लि.

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दर

क्र.सं.	लाभान्वित वर्ग	भत्ता प्राप्त गर्न योग्य उमेर र अवस्था	मासिक रकम (रु.)
१	ज्येष्ठ नागरिक	६८ वर्ष उमेर पुगेको	४०००
२	अन्य ज्येष्ठ नागरिक	६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरूका नागरिक र देशभरीका दलित नागरिक	२६६०
३	एकल महिला	विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी, बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका	२६६०
४	विधवा	पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका	२६६०
५	पूर्ण अपाङ्गता भएका	सम्बन्धित निकायबाट क वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरू	३९९०
६	अति अशक्त अपाङ्गता	सम्बन्धित निकायबाट ख वर्ग अर्थात् नीलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरू	२१२८
७	लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति	कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधिया	३९९०
८	बालबालिका	अनुसूची ५ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई	५३२

(मिति २०७९ श्रावण १ देखी २०८० असार

मसान्तसम्मको)

जन्मदर्ता:

- पुरुष: १५७१
- महिला: १३९९
- तेस्रो लिङ्गी: ०
- जम्मा: २९७०

मृत्युदर्ता:

- पुरुष: ३३१
- महिला: २०५
- जम्मा: ५३६

व्यक्तिगत घटना दर्ता

सम्बन्ध विच्छेदः २५

विवाह दर्ताः ९७८

बसाइ सरी आएकोः

- दर्ता संख्याः ७६५
- सदस्य संख्याः २२९७

बसाइ सरी जानेः

- दर्ता संख्याः २००
- सदस्य संख्याः ४९८

जम्मा घटना दर्ता संख्याः ५४७४

सासु वितरणको अवस्था

- १२ वटै वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत Forward Feed र Reverse Feed को माध्यमबाट वितरण भइरहेको ।
- नगरपालिकामा रहेका व्यक्तिगत घटना दर्ताका पुराना अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेसन गरिएको । (कार्यालयमा रहेका आ.व. ०६२/६३ देखी ०७३/७४ सम्मका अभिलेखहरू सबै डिजीटाइज भईसकेको र सूचना फारामहरू पनि भएको।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण चुस्त दुरुस्त तथा अद्यावधिक भएको ।

विपद व्यवस्थापन कोषको अवस्था

राहत कोषको रकम	खर्च भएको रकम	बाकी रकम
९७,२७,२७८ ।	१९,२७,२७८ ।	७८,००००० ।

रोजगार केन्द्रको कार्यक्रमहरु

क्र.सं.	सभाबाट स्वीकृत योजनाको नाम			वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	बजेट श्रोत	
	नाम	बजेट	लक्ष्य (जना)				
१	चाँप देखी बबेडी जाने घोरेटो बाटो मर्मत योजना	५७७०००	१०	५७४११५.००	१०		
२	चैकी देखी नायल सडक मर्मत योजना	८६५५००	१५	८६५५००.००	१५		
३	रातोपानी सामुदायीक वनमा असूडे निर्माण	२८८५००	५	२८८५००.००	५		
४	रोजगार रणनीति निर्माण	५००००	२ पटक	५००००	२ पटक		
५	रोजगार संवाद मञ्च गठन तथा अभिमूखिकरण	२००००	१ पटक	२००००	१ पटक		
६	रोजगार सेवा केन्द्र सम्बन्धी अभिमूखिकरण कार्यक्रम	५००००	१ पटक	५००००	१ पटक		
७	बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन तथा अनलाइन प्रविष्टीकरण	२७०००	१ पटक	२७०००	१ पटक		

क्षेत्रगत रुपमा भएको मुख्य उपलब्धीहरु (संभव भए सम्म फोटो सहित)

- गत आ व मा जम्मा रोजगारी सृजना संख्या १७१ जना
- गत आ व मा जम्मा रोजगारी दिन १२९८३ दिन औसत रोजगारी दिन ७६ दिन
- लाभग्राही मध्ये ११७ जना महिला र ५४ जना पुरुष रहेका
- कुल बजेट रु १०३७५०००। कुल खर्च रु ८९५६७६९। वित्तिय प्रगति ८६.३३ प्रतिशत

शैक्षिक संस्थाहरुको तहगत विवरण

सामुदायिक तर्फ

मा.वि. तह: कक्षा १-१२ संचालन भएका विद्यालयको संख्या १०

कक्षा १-१० संचालन भएका विद्यालयको संख्या ११

आधारभूत तह : कक्षा १-८ संचालन भएका विद्यालयको संख्या १०

कक्षा १-५ संचालन भएका विद्यालयको संख्या २३

कक्षा १-३ संचालन भएका विद्यालयको संख्या ३

संस्थागत तर्फ

मा.वि. तह: कक्षा १-१२ संचालन भएका विद्यालयको संख्या ८

कक्षा १-१० संचालन भएका विद्यालयको संख्या १३

आधारभूत तह : कक्षा १-८ संचालन भएका विद्यालयको संख्या १२

कक्षा १-५ संचालन भएका विद्यालयको संख्या ५

गोदावरी नगरपालिकाका शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

सामुदायिक विद्यालयहरुको संख्या - ५७

बालविकासको संख्या - १०८

सामुदायिक सिकाइकेन्द्रको संख्या - ५

संस्थागत विद्यालयको संख्या - ३८

क्याम्पस - २

विद्यार्थी विवरण २०८० को IEMIS अनुसार

	छात्रा	छात्र	जम्मा
बालबिकास	२१८२	३०५८	५२४०
कक्षा १-५	६०७९	७२५४	१३३३३
कक्षा ६-८	४०६९	४६३४	८७०३
कक्षा ९-१०	२७६९	२८९०	५६५९
कक्षा ११-१२	५७६	३८५	९६१
जम्मा	१५६७५	१८२२१	३३८९६

शिक्षामा बजेट

संघिय बजेट - ३२,२२,१३,०००

नगर बजेट - ७,३५,००,०००.००

जम्मा बजेट - ३९,५७,१३,०००

जम्मा खर्च- ३६,९९,७३,७४७

खर्च प्रतिशत- ९३.४९%

आ.व. ०७९/०८० मा स्वीकृत योजनाहरूमध्ये ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको योजनाहरू

ठेक्का संकेत नं.	योजनाको नाम	ठेकेदारको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	हालको अवस्था	ठेक्का सम्झौता रकम (भ्याट सहित)	हालसम्म खर्च भएको रकम (रनिङ्ग विल)	बाकि रकम
१ GM/NCB/W/01/2079/80	Construction of Blacktop road at different places of ward no 1	खप्तड निर्माण सेवा	२०७९।०९।१३	२०८०।०३।२९	सञ्चालनमा रहेको	4259118.97	2513043.39	1746075.58
२ GM/NCB/W/02/2079/80	Construction of Blacktop road at different places of ward no 2 & 4	माता गौरी निर्माण सेवा	२०७९।०९।१३	२०८०।०३।१०	सञ्चालनमा रहेको	6504521.89	3336332.46	3168189.43
३ GM/NCB/W/03/2079/80	Construction of Chaukidada Water Supply Project at Ward no 3	आकाश निर्माण सेवा, मेलम्ची सिन्धुपाल्चोक	२०७९।११।०८	२०८१।११।०७	सञ्चालनमा रहेको	42250859.78	15925731.65	26325128.13
४ GM/NCB/W/04/2079/80	Construction of Blacktop at different places of ward 1 and 2	जगदम्बा निर्माण सेवा	२०७९।११।१६	२०८०।०३।१५	सञ्चालनमा रहेको	7384361.81	1797136.19	5587225.62
५ GM/NCB/W/05/2079/80	Construction of blacktop road at different places of ward no 7 and 11	श्रीपुर डेभलपर्स ग्रुप प्रा लि	२०७९।१२।०५	२०८०।०३।२०	सञ्चालनमा रहेको	3768818.40	1479672.29	2289146.11
६ GM/NCB/W/06/2079/80	Construction of blacktop road at different places of ward no 3 & 4	जगदम्बा निर्माण सेवा	२०७९।१०।२०	२०८०।०३।२०	सञ्चालनमा रहेको	7485982.25	3938785.74	3547196.51

आ.व. ०७९/०८० मा स्वीकृत योजनाहरूमध्ये ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको योजनाहरू

ठेक्का संकेत नं.	योजनाको नाम	ठेकेदारको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	हालको अवस्था	ठेक्का सम्झौता रकम (भ्याट सहित)	हालसम्म खर्च भएको रकम (रनिङ्ग विल)	बाकि रकम
७ GM/NCB/W/ 07/2079/80	Construction of Blacktop road at different places of ward no 5 & 6	जगदम्बा निर्माण सेवा	२०७९।१।२०	२०८०।०३।१०	सञ्चालनमा रहेको	6872000.87	4385893.66	2486107.21
८ GM/NCB/W/ 08/2079/80	construction work of Shanti tole road at ward no 4	श्रीपुर डेभलपर्स ग्रुप प्रा लि	२०८०।०१।१४	२०८०।०३।१०	सञ्चालनमा रहेको	4388262.17	0.00	4388262.17
९ GM/NCB/W/ 09/2079/80	Construction work of Everest school to chitanyapur road	जगदम्बा निर्माण सेवा	२०८०।०१।८	२०८०।०३।१०	सञ्चालनमा रहेको	11160703.21	5394511.52	5766191.69
१० GM/NCB/W/ 10/2079/80	construction work of road drain at shanti tole ward no 4	एन के निर्माण सेवा	२०८०।०१।२०	२०८०।०३।१०	सञ्चालनमा रहेको	3605587.38	1194089.36	2411498.02
११ GM/NCB/W/ 11/2079/80	Construction of blacktop road at diffferent places of ward no 1	काफली कन्स्ट्रक्सन प्रा लि	२०८०।०२।०४	२०८०।०७।१५	सञ्चालनमा रहेको	4003162.55	872734.60	3130427.95
१२ GM/NCB/W/ 12/2079/80	Construction work of Godhdhuwa Culvert at Ward no 6	आर.के. निर्माण सेवा	२०८०।०२।११	२०८०।०७।१५	सञ्चालनमा रहेको	4015446.06	1325924.94	2689521.12

आ.व. ०७९/०८० मा स्वीकृत योजनाहरूमध्ये ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको योजनाहरू

	ठेक्का संकेत नं.	योजनाको नाम	ठेकेदारको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	हालको अवस्था	ठेक्का सम्झौता रकम (भ्याट सहित)	हालसम्म खर्च भएको रकम (रनिङ्ग विल)	बाकि रकम
१३	GM/NCB/W/13/2079/80	construction work of adminstration building of ward office ward no 4	पि के निर्माण सेवा	२०८०।०२।३१	२०८०।१२।१५	सञ्चालनमा रहेको	8744367.54	0.00	8744367.54
१४	GM/SQ/W/01/2079/80	construction works of ward no 2 rajmarga to uttar bankhet road drain	एन के निर्माण सेवा	२०८०।०१।२६	२०८०।०३।१५	सञ्चालनमा रहेको	1503749.57	0.00	1503749.57
१५	GM/SQ/W/02/2079/80	Construction of blacktop road and drain works at bhangelu chowk dekhi paschim uttar hudai kun narayan ko ghar samma	ठेक्का नलागेको	लागत अनुमान रु १९९८६२८.८५			1998628.85	0.00	1998628.85
१६	GM/SQ/W/03/2079/80	Michale Ranako ghar dekhi Suryodaya Aadharbhut Vidhyalaya samma adhuro pitch and Khemraj Bhandari ko ghar dekhi Ramjanaki mandir jane batoma kalopatre niranman	विष्णु निर्माण सेवा	२०८०।०२।१४	२०८०।०८।१५	सञ्चालनमा रहेको	1747771.56	1047109.43	700662.13

आ.व. ०७९/०८० मा स्वीकृत योजनाहरूमध्ये ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको योजनाहरू

ठेक्का संकेत नं.	योजनाको नाम	ठेकेदारको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	हालको अवस्था	ठेक्का सम्झौता रकम (भ्याट सहित)	हालसम्म खर्च भएको रकम (रनिङ्ग विल)	बाकि रकम
१७ GM/SQ/W/04/ 2079/80	Construction works of drain and blacktop road at dada tole	विष्णु निर्माण सेवा	२०८०।०२।१४	२०८०।०३।१५	सञ्चालन मा रहेको	1911226.37	0.00	1911226.37
१८ GM/SQ/W/05/ 2079/80	Construction works of blacktop road at masanghat road	ठेक्का नलागेको	लागत अनुमान रु १९५९४३२.०८			1959432.08	0.00	1959432.08
१९ GM/SQ/W/06/ 2079/80	Construction of Road and drain (Durgalaxmi complex Pachhadi Ring Road dekhi Namaste Party Palace Samma)	भागरथी जेनिथ कन्स्ट्रक्सन प्रा लि	२०८०।०२।१६	२०८०।०८।१५	सञ्चालन मा रहेको	1433349.16	839727.36	593621.80
	जम्मा रकम					124997350.47	44050692.59	80946657.88

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पादित उल्लेखनीय कार्यहरु

क्र सं.	प्रमुख कार्यक्रमहरु	उपलब्धीहरुको विवरण
१	गोनपा १ को वडा कार्यालयको भवन निर्माण	आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह
२	गोनपा ९ को वडा कार्यालयको भवन निर्माण	आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह
३	गोनपा को प्रशासकीय भवन निर्माण	आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह
४	वडा नं. १० र १२ को वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । वडा नं. ४ को भवन निर्माण ठेक्का आह्वान भई सम्झौता समेत भईसकेको छ ।	
५	अत्तरिया चोकमा High Mast Light र Water Fountain जडान	आन्तरिक पर्यटकीय स्थल भएको
६	वडा नं. १२ को टुडेला खोला र चाक्लेखोलामा ४०० मिटर तटबन्धन निर्माण	नदी कटान नियन्त्रण
७	सडक स्तरोन्नती हालसम्म १५० कि.मी. सडक ग्राभेल, ४५ कि.मी. नयाँ ट्रयाक खुलेको छ । दुई वटा मोटरेल पुल मध्ये गेडेपानी निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको र चैतन्यपुर पुल निर्माण सम्पन्न भईसकेको छ ।	यातायातमा सहजता भएको
८	नदीजन्य पदार्थ विक्री शुल्क संकलन कार्य ठेक्काबाट व्यवस्थापन गर्नका लागि ६ पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत ठेक्कामा नगएकोमा २०७९ पौष देखि कार्यालय स्वयमले संकलन गरी रु ४ करोड २१ लाख ६० हजार भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ ।	
९	eBPS सफ्टवेयरबाट घरनक्सा पासको तथ्यांक राख्ने गरेको	हालसम्म ८५० भन्दा बढी घरहरुको घरनक्सा पासको प्रमाणपत्र वितरण
१०	Sutra, PAMS, Online.donidcr, IEMIS, ITP, DHIS-2, eLmis, eTB register सफ्टवेयर सञ्चालन	सेवा प्रवाहमा शीघ्रता

पेशकी बेरुज तथा फछ्यौटको अवस्था



संघीय सरकारबाट
प्राप्त अनुदान तर्फ

0%

फछ्यौट प्रतिशत

173311551

बेरुज

0

फछ्यौट



प्रदेश सरकारबाट
प्राप्त अनुदान तर्फ

0%

फछ्यौट प्रतिशत

1612195

बेरुज

0

फछ्यौट



आन्तरिक श्रोततर्फ
(राजश्व बाँटफाट र
रोयल्टी समेत)

0%

फछ्यौट प्रतिशत

225916224

बेरुज

0

फछ्यौट

गोदावरी नगरपालिकामा देखिएका मुख्य चुनौतीहरू

- एकल र साझा अधिकारका विषयमा आवश्यक कानूनको यथाशीघ्र निर्माण गरि सोको कार्यान्वयन
- मर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिमको प्रवन्ध गरि सिप र दक्षता अभिवृद्धी गर्नु,
- स्थानीय तहमा बढ्दै गइरहेको बेरुज्जुलाई न्युनीकरण गर्नु
- नीति तथा कार्यक्रमबीच तादाम्यता मिलाउनु,
- करको दायरा फराकीलो पाउँदै आन्तरिक आयमा बढोत्तरी ल्याउनु

क्रमश...

- वार्षिक गुरयोजना अनुसार सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गर्नु,
- सिमित बजेट बाट जनताका असिमित चाहना पुरा गर्नु,
- विकास निर्माणका क्रियाकलापहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गरि विकासलाई समावेशी दिगो र बलियो बनाउनु,
- संघ र प्रदेश बाट प्राप्त हुने अनुदान समयमै प्राप्त गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु,
- पछिल्लो समयमा कर्मचारी व्यवस्थापनको मियोको रुपमा रहेको संघीय निजामति सेवा ऐन जारि नहुदा यसको असर तीन तहका सरकारमा देखिनु,

गोदावरी नगरपालिकाका केही असल अभ्यासहरु

सा.सु. भत्ता बैंकिंग प्रणालीमा

व्यक्तिगत घटना दर्ता सबै

आवद्ध

वडाबाट Online

स्थानीय तहको पाठ्यक्रम

मजदुर परिचय पत्रको शुरुवात

निर्माण

एकीकृत फोहोरमैला केन्द्रको

कर्मचारी नियमितताको लागि E

शुरुवात

हाजिरीको व्यवस्था

प्राविधिक शिक्षामा जोड, साक्षर

मालाखेती अस्पतालबाट २४

नगर घोषणा

घण्टे आकस्मिक सेवा प्रदान

*Thank
you*

